

Vertrouwelijk

Eindrapport

Projectevaluatie Al-Muthanna SFIR (2003 – 2005)



Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Veiligheidsbeleid
Opdrachtnemer: ██████████
Contactpersoon: ██████████
Datum: 28 februari 2013
Projectnummer: 24892
Versie: 1.0

Evaluatie projecten Al-Muthanna SFIR (2003-2005)
© 2013, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG
Nederland

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	5
1.1	AANLEIDING.....	5
1.2	WERKWIJZE	5
2.	SITUATIESCHETS PROVINCIE AL-MUTHANNA	6
2.1	VEILIGHEIDSSITUATIE SAMAWA.....	6
2.2	POLITIEKE SITUATIE	6
2.3	LEEFOMSTANDIGHEDEN BEVOLKING	7
2.4	SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE	9
2.4.1	<i>Onderwijs</i>	9
2.4.2	<i>Mensenrechten</i>	9
2.5	ECONOMISCHE SITUATIE EN BEDRIJVGHEID	9
2.5.1	<i>Werkgelegenheid</i>	11
2.5.2	<i>Corruptie</i>	11
3.	ONDERWIJS	12
3.1	INLEIDING	12
3.2	HOUSING INSTITUTE FOR EDUCATION.....	13
3.3	AL IMAM HUSSEIN SCHOOL.....	14
3.3.1	<i>Huidige status van het project</i>	14
3.3.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	14
3.4	RHYEEM MEISJESSCHOOL.....	17
3.4.1	<i>Huidige status van het project</i>	17
3.4.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	17
3.5	ZUHAIR BIN ABI SELMA BASISSCHOOL.....	19
3.6	AL-FETUWA SCHOOL	22
3.7	MIDDELBARE SCHOOL WATHBA	25
4.	SCHOONWATERVOORZIENINGEN.....	27
5.	ECONOMIE	28
5.1	CEMENTFABRIEK MUTHANNA.....	28
5.1.1	<i>Huidige status van het project</i>	28
5.1.2	<i>Elektriciteitsproblemen</i>	30
5.1.3	<i>Concurrentie</i>	30
5.1.4	<i>Investeren</i>	30
5.1.5	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	31
5.2	SLACHTHUIS SAMAWA	33
5.2.1	<i>Huidige status van het project</i>	33
5.2.2	<i>Beheer</i>	34
5.2.3	<i>Onderhoud</i>	34
5.2.4	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	35
6.	ELEKTRICITEITSVOORZIENING.....	37
6.1	SUBSTATION HILAL	37
6.1.1	<i>Huidige status van het project</i>	37
6.1.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	37

6.2	SUBSTATION NAJMI	39
6.2.1	<i>Huidige status van het project</i>	39
6.2.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	39
6.3	SUBSTATION MAJED	40
6.3.1	<i>Huidige status van het project</i>	40
6.3.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	40
7.	DIVERSEN	41
7.1	POLITIEBUREAU INDARRADJI	41
7.2	BRANDWEERKAZERNE AL-KHIDIR	42
7.2.1	<i>Huidige status van het project</i>	42
7.2.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	42
7.3	RESTAURATIE GEBOUW VROUWENBEWEGING	44
7.3.1	<i>Huidige status van het project</i>	44
7.4	POLITIEBUREAU NAJMI	46
7.5	POLITIEBUREAU BUSAYA	46
7.6	POLITIEBUREAU HILAL	46
7.7	JONGEREN- EN SPORTCENTRUM VOOR VROUWEN	47
7.7.1	<i>Huidige status van het project</i>	47
7.8	JONGERENCENTRUM WARKA	49
7.8.1	<i>Huidige status van het project</i>	49
7.8.2	<i>Bijdrage aan de lokale bevolking</i>	50
7.9	SPORTCLUB AL-WARKA	52
BIJLAGE I:	CONTACTPERSONEN	53

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Nederland heeft vanaf juli 2003 tot medio maart 2005 deelgenomen aan de door het Verenigd Koninkrijk geleide zuidelijke sector van de *Stabilisation Force Iraq* (SFIR) in Irak. Ten behoeve van een post-missie beoordeling van de Nederlandse bijdrage aan de missie in Irak, wordt [REDACTED] gevraagd 25 projecten te bezoeken en evalueren. De projecten zijn tijdens de aanwezigheid van SFIR uitgevoerd in de provincie Al-Muthanna, Irak.

De opdracht is drieledig:

- Bezoek en evaluatie van 25 projecten;
- Een korte schets maken van de huidige situatie in Al-Muthanna;
- Een lijst van contactgegevens.

In het eindrapport worden resultaten voortkomend uit de gevoerde gesprekken met (in)directe betrokkenen en lokale bevolking en bezoeken aan de locaties beschreven. Er zullen indien mogelijk antwoord gegeven worden op de volgende vragen:

- Bestaat het project nog?
- Wat is de huidige status van het project?
- Op welke manier heeft het project bijgedragen aan de lokale bevolking?
- In hoeverre draagt het project momenteel nog bij aan de lokale bevolking?

In hoofdstuk 2 wordt in gegaan op de huidige situatie in de provincie Al-Muthanna. In een korte schets wordt de veiligheidssituatie, de politieke situatie, de leefomstandigheden, de sociaal maatschappelijke situatie en de economische situatie besproken. Vervolgens worden in de hoofdstukken 3 tot en met 7 ingegaan op de verschillende SFIR-projecten.

1.2 Werkwijze

De projecten worden door de lokale partner van [REDACTED] de heer [REDACTED] bezocht en geëvalueerd. De heer [REDACTED] is opgegroeid in Irak en sinds 1991 woonachtig in Nederland, samen met een lokale gids en een chauffeur zal de heer [REDACTED] de projectevaluaties in Irak uitvoeren.

In de voorbereidingsfase van de projectevaluaties heeft de heer [REDACTED] bezoeken gebracht aan de lokale overheid in Samawa. De heer [REDACTED] heeft een bezoek gebracht aan de Governorate Samawa en gesproken met een goede bekende van hem, [REDACTED]. De heer [REDACTED] verbleef tijdens de Eerste Golfoorlog samen met de familie [REDACTED] in het vluchtelingenkamp in Rafiah (Saoedi-Arabië) en hebben beiden in Nederland gewoond. Tijdens het gesprek heeft de heer [REDACTED] de heer [REDACTED] voorgesteld aan de heer [REDACTED] directeur planning en follow up. De heer [REDACTED] is goed op de hoogte van de projecten die te maken hadden met Jeugd- en Sportzaken, die onder andere door SFIR zijn uitgevoerd. Hij heeft aangeboden om alle projecten die te hebben met Jeugd- en Sportzaken een medewerker van hem mee te sturen om ondersteuning te bieden.

2. Situatieschets provincie Al-Muthanna

Provincie:	مِنْشَلَا <i>Al Muthannā</i>
Gouverneur Al-Muthanna:	Ibrahim S. Al-Miali
Voorzitter provinciehuis Al-Muthanna:	Abdul Latif H. Al-Hassani
Hoofdstad:	Samawa
Aantal inwoners:	719.824
Beroepsbevolking:	315.000
Verdeling man/vrouw:	50/50
Grootte van de provincie:	51.740 m ² (11,9% van Irak)
Drie grootste steden:	Samawa, Rumaythah, al Khidhir.
Belangrijkste industrieën:	Landbouw, textiel, olie, zoutwinning, pluimvee, diervoeder, visserij

Bron: Republic of Iraq – Industrial Development Authority

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie in de provincie Al-Muthanna beschreven. Voor de beschrijving van de huidige situatie is gebruik gemaakt van onderzoeken van het *Inter-Agency Information and Analysis Unit*, gesprekken met de lokale bevolking en waarnemingen van de heer al-Gazzali.

2.1 Veiligheidssituatie Samawa

De veiligheidssituatie in Samawa, de hoofdstad van de provincie Al-Muthanna, en de omliggende dorpen is relatief stabiel. Opvallend is dat er mede door de sociale controle in het gebied, vrij weinig controleposten meer zijn in en rondom de stad. Het overwegend Sjiitische gebied wordt mede veilig gehouden door een goede samenwerking tussen de verschillende stammen. Elke inwoner van Samawa hoort bij een bepaalde stam, men weet vaak van elkaar wie bij welke stam hoort. Zodoende is het makkelijk te achterhalen wie verantwoordelijk is geweest bij eventuele incidenten.

De handhaving van de algemene veiligheid in de stad en dorpen rondom Samawa worden verzorgd door de Iraakse politie (*Iraqi Police Service*), Federale politie en het Iraakse leger. De politie in uniform is zichtbaar aanwezig op straat. Er kan geconstateerd worden is dat de situatie relatief veilig is, de mensen op straat vertellen dat er vrij weinig bomaanslagen worden gepleegd en/of terroristische activiteiten worden gesignaleerd. Echter, er vinden net als elders in de wereld vinden ook in Samawa criminele activiteiten plaats, enkele voorbeelden hiervan zijn: drugssmokkel, diefstal en smokkel van olie, autodiefstal, berovingen.

2.2 Politieke situatie

De Islamistische Dawa Partij, ook wel de Hizb Al-Da'wa Al-Islāmiyya partij genoemd, is net als in de landelijke politiek, de grootste partij in Al-Muthanna. De huidige lokale politieke situatie is onstabiel te noemen. Mismanagement en corruptie is aan de orde van de dag, politici denken vooral aan hun eigen portemonnee in plaats van het algemeen belang. Enkele voorbeelden zijn: ambtenaren vragen geld van burgers die (burgelijke) zaken geregeld willen hebben, ambtenaren die financieel mee willen profiteren aan de overheidsprojecten etc. Daarnaast stelt de lokale overheid weinig tot geen prioriteit aan de wederopbouw van het gebied door bijvoorbeeld het aanleggen en verbeteren van de onder- en bovengrondse infrastructures of met de aanleg van elektriciteitsnetwerken.

In vele delen van de stad Samawa heerst enorme armoede. De economische ontwikkelingen in de provincie Al-Muthanna is enorm achtergebleven met de landelijke groeiontwikkelingen. Het is opvallend om te zien dat de al Sadr aanhang het grootst is in de gebieden waar veel armoede heerst. De al Sadr partij profileert zich als een partij voor de gewone Irakees en belooft de armen een beter bestaan. Het is ook een partij die misstanden van de huidige regering, vooral van minister-president Jawad al-Maliki, aan de kaak stelt.

Tabel 2.1:
MUTHANNA 2009 Provincial Councils Elections

Partij	% van de stemmen	Zetels
State of Law/Nuri Kamal al-Maliki/Shiite Islamist	10.9%	5
ISCI/Shiite Islamist	9.3%	5
Al Jumhour	7.1%	3
National Reform Trend/Ibrahim al-Jaafari/Shiite Islamist	6.3%	3
Sadrists/Shiite Islamist	5.5%	2
National List	5.0%	2
Gathering of Muthanna	4.9%	2
The Qualified of Iraq	4.4%	2
Middle Euphrates	3.9%	2
Overige partijen	43.0%	
	100%	26

(Bron: *New York Times*)

De lokale bevolking is zeer ontevreden met de huidige lokale en centrale overheid. Desondanks zal de bevolking niet snel in opstand komen. De tijd waarin Saddam Hoessein demonstranten zwaar werden gestraft ligt nog te vers in het geheugen.

De kans dat de al-Sadr bij de komende provinciale verkiezingen in 2013 één van de grootste partijen zal gaan worden in Al-Muthanna is zeer groot. Vanwege de onvrede over de economische ontwikkelingen in het gebied groeit de aanhang van de al-Sadr partij groeit met de dag. Daarnaast belooft de partij zaken aan te pakken die momenteel niet door de huidige regering Maliki worden aangepakt, zoals corruptie binnen de overheid, mismanagement, verspilling van overheidsmiddelen, bureaucratie etc. Uit gesprekken met de lokale bevolking blijkt duidelijk naar voren te komen waarom de ontwikkelingen achterlopen met de rest van het land: De corruptie onder ambtenaren is zeer hoog. Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming rondom de projecten vragen vaak een percentage van de projectwaarde in ruil voor goedkeuring van de projecten. Hierdoor werden projecten te duur om uitgevoerd te worden of werden helemaal niet meer uitgevoerd.

2.3 Leefomstandigheden bevolking

Uit een rapport¹ van de Verenigde Naties blijkt dat de provincie Al-Muthanna een van de armste provincies is, met een gemiddeld inkomen van IQD 118.158 (US\$ 100) per maand. Ongeveer de helft van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens. De leefomstandigheden zijn soms erbarmelijk, vooral in de dorpen. De mensen wonen in ongeïsoleerde woningen, gebouwd van

¹ Inter-Agency Information and Analysis Unit, *Food Security and Expenditure Factsheet, December 2011*

2.4 Sociaal maatschappelijke situatie

Traditionele Iraakse waarden en normen worden steeds belangrijker, omdat er geen stabiele economische ontwikkelingen plaatsvinden in diverse gebieden in al-Muthanna. De lokale bevolking profiteert nauwelijks mee aan de welvaart en economische ontwikkelingen van de rest van het land. Daarnaast functioneert het rechtssysteem nauwelijks en floreert de corruptie.

2.4.1 Onderwijs

Uit gesprekken met de lokale bevolking blijkt dat er veel onvrede is over de beschikbaarheid van goed onderwijs en goede zorg. Er is in het gebied een groot tekort aan onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. De bevindingen op straat worden ondersteund door cijfers van de Verenigde Naties. Het analfabetisme is ongeveer 24%-31%², voor vrouwen is ligt het percentage zelfs op 36%-40%³. De provincie Al-Muthanna heeft 61 middelbare scholen, vijf scholen voor beroepsonderwijs en drie docentenscholen.

2.4.2 Mensenrechten

De mensenrechten worden in het gebied nauwelijks nageleefd. Het komt regelmatig voor dat mensen geen eerlijk proces krijgen, doordat rechters worden omgekocht of onder druk worden gezet door politici. Vanwege het onbetrouwbare rechtssysteem, is bloedwraak een veel voorkomende vorm van rechtspraak en recht krijgen. Vooral in de kleine steden en dorpen, waar stamhoofden de straffen bepalen.

Verder zijn er geen overheidsinstanties die erop toezien dat de mensenrechten nageleefd wordt. Internationale organisaties, zoals Human Right Watch of Amnesty International zijn niet actief in Irak, zij durven Irak niet in te komen. Hierdoor blijft de mensenrechtensituatie onveranderd.

2.5 Economische situatie en bedrijvigheid


Al-Muthanna is een grote producent van dadels en van verschillende zoutsoorten. Het zout wordt gebruikt voor de productie van cement, de grootste cementfabrieken van Irak bevinden zich daarom in deze provincie. Naast de voorgenoemde heeft Al-Muthanna een groot diversiteit van verschillende bedrijven. Figuur 2.2 geeft een goed overzicht weer van de sectorverdeling van de lokale Midden en Kleinbedrijven in Al-Muthanna.

In Al-Muthanna zijn vooral kleine tot middelgrote jonge bedrijven actief. Uit een onderzoek van USAID blijkt dat iets meer dan 70% van de door hen ondervraagde ondernemingen korter dan zes jaar bestaat.

² Inter-Agency Information and Analysis Unit, *Literacy in Iraq Fact Sheet, September 2010*

³ Inter-Agency Information and Analysis Unit, *Women in Iraq Fact sheet, March 2012*


Figuur 2.2: Onderverdeling MKB-bedrijven in Muthanna naar grootte en sector.

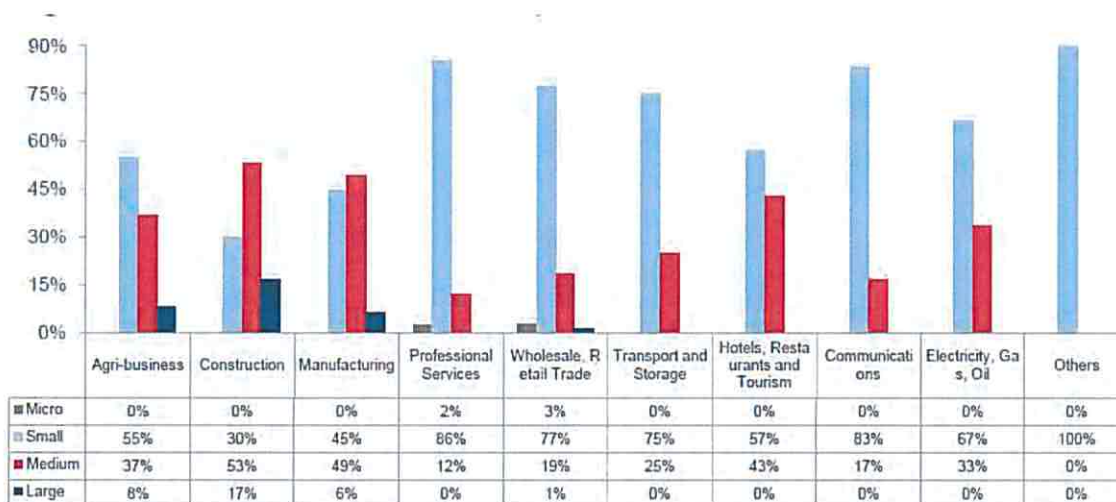

Bron: USAID-TIJARA Market Assessment Report Muthanna, maart 2010

De detailhandel in Al-Muthanna vormt een belangrijk onderdeel van de lokale economie. In figuur 2.3 is te zien dat er gemiddeld veel meer detailhandels zijn in Al-Muthanna, dan het landelijk gemiddelde. De kleine ondernemers doen het er in het algemeen goed. Je ziet dat vooral de detailhandel in etenswaren en kleding, maar ook kapsalons en internetcafés geen gebrek aan klandizie hebben.

Figuur 2.3: Sectorvergelijking Muthanna en Irak

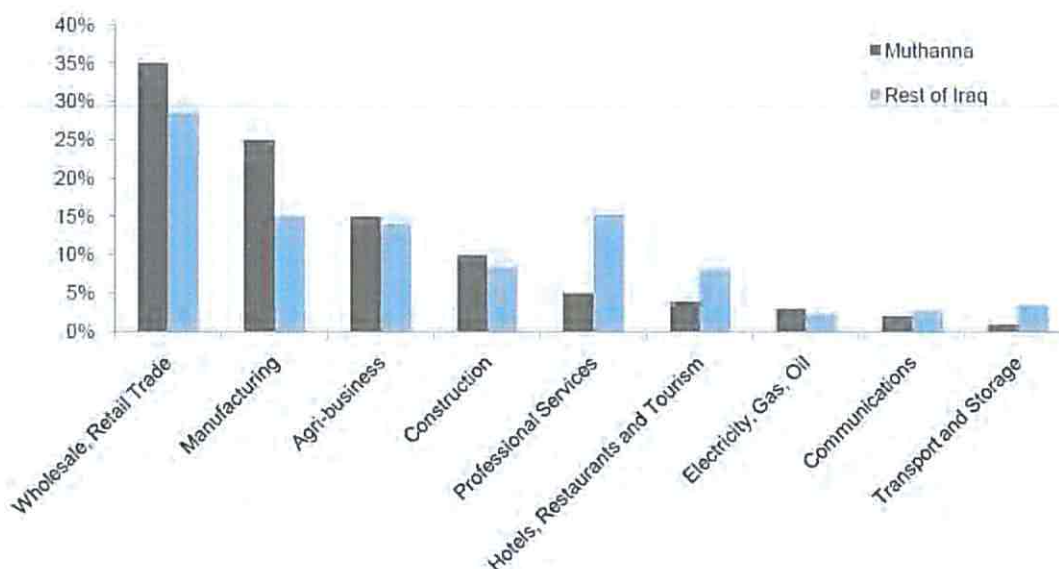

Bron: USAID-TIJARA Market Assessment Report Muthanna, maart 2010

2.5.1 Werkgelegenheid

De werkloosheid is overal zichtbaar, talloze werkloze jongeren zijn al om 10 uur 's ochtend te vinden in één van de vele cafés van Samawa. Het werkloosheidspercentage ligt op ongeveer 25%-28% van de beroepsbevolking, slechts 10%-14% van de vrouwen werkt. De oorzaak van het hoge werkloosheidscijfer ligt vooral aan de sterk verwaarloosde economische ontwikkelingen. Veel jongeren trekken naar naastgelegen provincies als An Najaf of Karbela, die economisch beter ontwikkeld zijn. Daarnaast is de kans het vinden van baan in de naastgelegen provincies een stuk groter dan in Al-Muthanna.

2.5.2 Corruptie

Corruptie is een groot en wijdverspreid probleem in Irak. Het land staat in de top 10 op de lijst van meest corrupte landen van Transparency International. Het kost de Iraakse overheid enorm veel geld en het zorgt ervoor dat projecten niet van de grond komen. Daarnaast zorgt de corruptie ervoor dat mensen op hoge posities terecht komen die daar niet horen.

De lokale bevolking leidt enorm onder de wijdverspreide corruptie. Volgens de lokale bevolking hebben tijdens de uitvoering van de SFIR projecten incidenten voorgedaan die te maken hadden met corruptie. Er zou door SFIR teveel betaald zijn aan de Iraakse aannemers die opdrachten hebben uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de projecten heeft SFIR Koerdische vertalers ingeschakeld. Volgens de betrokkenen zijn er prijsafspraken gemaakt met de Koerdische vertalers. Naar verluidt hebben Koerdische vertalers een percentage van de projectwaarde gevraagd en ontvangen van de uitvoerders van de projecten. Verder werden de projecten niet door de opdrachtgevers gecontroleerd en/of gemanaged, waardoor er onduidelijke situaties ontstonden.

3. Onderwijs

3.1 Inleiding

Alvorens de bezoeken aan de projectlocaties van de scholen heeft de heer [REDACTED] gesprekken gevoerd met de heer [REDACTED] [REDACTED] van het directoraat voor Educatie. Volgens de heer [REDACTED] hebben de Nederlanders goed werk verricht. De verrichtte werkzaamheden bestonden vooral uit kleine renovatiewerkzaamheden. De andere landen die Irak hielpen bij wederopbouwprojecten en andere organisaties financierden vooral de grotere projecten.

De heer [REDACTED] is goed bekend met de omgeving en gaf aan dat Ibn Khaldun school niet in Rumaytha te vinden is, maar in Samawa. En de Al Khaleej School niet in al Warka, maar in Sewer. Verder gaf de heer [REDACTED] aan dat de Lowaah school (staat niet op de evaluatielijst) in Samawa gedeeltelijk voltooid door de Nederlanders.

De overige organisaties die aan de wederopbouw van Irak werkten in Al-Muthanna waren onder andere Habidaad en de Japanse overheid. Deze partijen hebben complete scholen gebouwd met kwalitatieve en duurzame materialen. De Nederlandse projecten zijn vergeleken met projecten van Habidaad of van de Japanners van matige kwaliteit. Enkele voorbeelden zijn: de verf die gebruikt is om muren te verven bladderde zeer snel af en er ontstonden snel barsten in de muren. Al met al is de lokale bevolking dankbaar voor de geleverde diensten, maar hebben de Nederlanders geen goede indruk van het geleverde werk achtergelaten. Volgens de geïnterviewde personen komt dit vooral door de corrupte vertalers die in dienst zijn genomen door de Nederlandse overheid. De vertalers hebben volgens ingewijden een percentage van de opdrachtwaarde ontvangen, waardoor er minder geld beschikbaar was om goed en kwalitatief werk af te leveren.

In de navolgende paragrafen zullen de scholen geëvalueerd worden.

3.2 Housing Institute for Education

Het is onduidelijk wat het project inhoudt. De heer [REDACTED] heeft een afspraak kunnen maken met [REDACTED] binnen het directoraat, evenals [REDACTED]. Beide directeuren en talloze andere ambtenaren binnen het directoraat hebben de heer [REDACTED] verzocht de evaluatie naar het project te staken. De reden is dat men bang is dat de uitkomst van de evaluatie enkele personen die destijds betrokken zijn bij het project en momenteel nog werkzaam zijn binnen het directoraat zou kunnen 'beschadigen'.

De heer [REDACTED] van het directoraat voor Jeugd en Sport [REDACTED], heeft beschikt over meer informatie betreffende het project, maar wilt hier geen uitspraken over doen. Hij heeft aangegeven niet met andermans zaken wilt bemoeien. Derhalve is er geen informatie over het project beschikbaar.



3.3 Al imam Hussein School

Het schoolgebouw is gebouwd in 1972. SFIR heeft in 2004 Iraakse aannemers de opdracht gegeven om de school te renoveren, zodat de middelbare school weer heropend kan worden. De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van vloertegels, het verven van muren en het bouwen van een toiletruimte. Uit diverse gesprekken blijkt dat men niet geheel tevreden is over de kwaliteit van de renovatie. De huidige directie van de school is van mening dat het geld beter besteed had kunnen worden. De Iraakse aannemer die door SFIR aangesteld was, werkte nauw samen met Koerdische vertalers van het Nederlandse leger. Deze vertalers zouden naar verluid een percentage van de aanneemsom hebben ontvangen. Hierdoor zou er te weinig geld over zijn gebleven om het project naar behoren te kunnen uitvoeren.

De lokale bevolking denkt dat het Nederlandse leger vooral focus had op de zeer arme locaties met veel problemen, en minder aandacht had voor andere locaties in Samawa. De reden hiervoor is dat de lokale bevolking denkt dat de Nederlanders snel resultaat wilde boeken in de zeer arme locaties, en daarom minder aandacht hadden voor de minder arme locaties.

Contactpersoon:




3.3.1 Huidige status van het project


Op de middelbare school zitten ongeveer 500 jongens. Het schoolgebouw heeft al enige tijd te kampen met veel achterstallig onderhoud. Volgens de heer [REDACTED] van de middelbare school, moet er snel een groot onderhoud plaats vinden.



3.3.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

De heropening van de middelbare school heeft voor zowel tijdelijke als permanente nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. De school is door Iraakse aannemers gerenoveerd en biedt dankzij de heropening werk aan talloze leraren.

De lokale bevolking is tevreden over het feit dat er de kinderen naar school kunnen en op onderwijs kunnen rekenen.



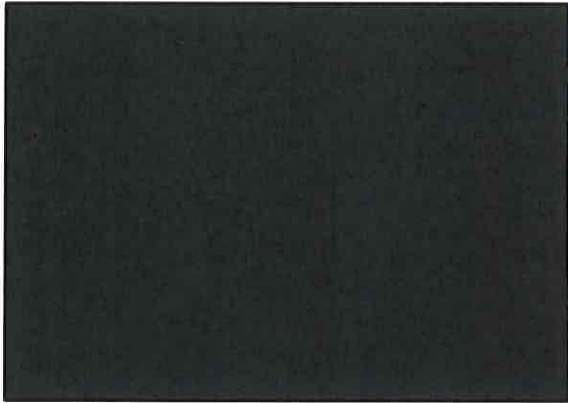



3.4 Rhyeem meisjesschool

De Rhyeem meisjesschool in Al Khidir is in 2011 gesloopt in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De meisjesschool is door jarenlange achterstallig onderhoud dermate vervallen, dat men besloten heeft om de school te slopen en te herbouwen.

Contactpersoon:



3.4.1 Huidige status van het project

De lokale autoriteiten van Al Khidir hebben in 2012 Iraakse aannemers de opdracht gegeven om de nieuwe school te bouwen, en zal Rabab school gaan heten. De bouw van de nieuwe school wordt bekostigd vanuit regionale ontwikkelingsgelden.



3.4.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

De lokale bevolking heeft aangegeven de Nederlandse SFIR zeer dankbaar te zijn voor de renovatie van hun school. Ook in dit project was sprake geweest van een tijdelijke toename van de werkgelegenheid, de renovatie is verzorgd door lokale aannemersbedrijven. Het aantal docenten voor en na de renovatie is hetzelfde gebleven.

De grootste bijdrage is vooral het sociaal maatschappelijke aspect. Een groot aantal meisjes hebben in Irak geen toegang tot goed onderwijs, waardoor het analfabetisme onder vrouwen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Elke meisjesschool dat open blijft of erbij komt zorgen ervoor dat meisjes goed onderwijs kunnen volgen.



3.5 Zuhair bin Abi Selma basisschool


De Zuhair bin Abi Selma basisschool is sinds oktober 2012 gesloten, omdat er in de omgeving een nieuwe school wordt gebouwd. Het oude schoolgebouw is de afgelopen jaren slecht onderhouden, de leslokalen en faciliteiten waren verouderd en onbruikbaar.

Contactpersoon:

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Tijdens het bezoek heeft de heer [REDACTED] kort gesproken met [REDACTED] van de school. De heer [REDACTED] zou meer moeten weten over het project, maar was daarna helaas niet bereikbaar vanwege de religieuze festiviteiten in Najaf. Derhalve is er, naast de gemaakte foto's, geen informatie beschikbaar over het project.

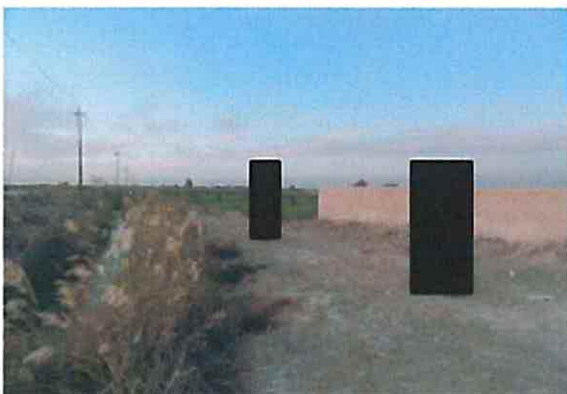





3.6 Al-Fetuwa School

SFIR heeft een lokale aannemer de opdracht gegeven de al Fetuwa school te renoveren. De Iraakse aannemer heeft de school geverfd, betegeld en reparaties uitgevoerd, waaronder aan de elektriciteitsvoorziening. Naast de renovatie van het schoolgebouw heeft men nieuwe toiletten gebouwd en een klein gebouw gebouwd, waar de directie van de school zetelt. Helaas heeft de heer [REDACTED] geen vertegenwoordiger(s) van de school kunnen spreken en is geen aanvullende informatie voorhanden.

Contactpersoon:

[REDACTED]







3.7 Middelbare school Wathba

De Wathba middelbare school is een zeer oude school, dat in de tijd van Saddam Hoessein zwaar is verwaarloosd. Lokale aannemers hebben in opdracht van SFIR de school gerenoveerd. De werkzaamheden bestonden uit: het opnieuw betegelen van vloeren, het verven van muren, de bouw van een doucheruimte en toiletten.

Contactpersoon:



De Wathba school is de enige school voor een groot aantal leerlingen uit de wijde omgeving. In het gebied wonen veel gezinnen met veel kinderen. Meer informatie over dit project is niet beschikbaar.



4. Schoonwatervoorzieningen

De projecten met betrekking tot de schoonwatervoorzieningen, het waterzuiveringsstation en de *Sewage D quarter*, konden niet getraceerd worden. Uit gesprekken met de heer [REDACTED] [REDACTED] bij het directoraat voor Riolering, blijkt dat beide projecten onbekend zijn binnen het directoraat. Derhalve is er geen informatie beschikbaar.

Contactpersoon:

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

5. Economie

In dit hoofdstuk worden de projecten geëvalueerd die te maken hebben met een economische impact op de lokale economie. De projecten die besproken zullen worden zijn: een cementfabriek Muthanna, een slachthuis en een irrigatiekanaal inclusief twee bruggen. Het project *Irrigatiekanaal* wordt vanuit twee verschillende Iraakse partijen geëvalueerd en zullen als addendum toegevoegd worden aan het rapport.

5.1 Cementfabriek Muthanna

De plaatselijke cementfabriek, gebouwd in 1984, was tijdens de oorlog lange tijd gesloten geweest. SFIR heeft de fabriek in 2003 of 2004 weer heropend. Volgens de heer [REDACTED] van de cementfabriek, is het onduidelijk welke rol SFIR toentertijd heeft gehad. De fabriek werd immers alleen heropend, er werd niet geïnvesteerd in nieuwe machines, materialen en/of overige inventarissen. De heer [REDACTED] geeft verder aan dat SFIR zich vooral heeft gericht op het opleiden en trainen van mensen. Het betrof trainingen op het gebied van de bedrijfsveiligheid, managementtraining en alles wat te maken had met het succesvol opstarten van de fabriek.

Contactpersoon:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



5.1.1 Huidige status van het project

De fabriek draait momenteel ruim ver onder haar maximale productiecapaciteit en heeft ongeveer 1.600 medewerkers in dienst. Men schat dat de huidige capaciteit tussen de 10% en 20% van het maximaal haalbare ligt. Ter vergelijking, in 1984 had de fabriek 350 medewerkers in dienst die 100% van de maximaal haalbare capaciteit behaalde. De fabriek ziet er verouderd uit, er is veel achterstallig onderhoud.

Door het achterstallige onderhoud zijn diverse delen van de fabriek onbruikbaar en/of te onveilig geworden om operationeel te houden. Eén van de oorzaken van het achterstallige onderhoud is van financiële aard. De fabriek heeft duidelijk te kampen met financiële problemen, er wordt geen winst gemaakt. De maandelijkse verliezen van de fabriek zorgen voor onwenselijke situaties. Het komt regelmatig voor dat salarissen van enkele medewerkers niet betaald worden, vanwege een tekort

aan geld. Een andere oorzaak is vanwege de schaarste aan goede vervangingsonderdelen voor de fabriek.

Het geld om te investeren in het onderhoud en/of voor vervangingsonderdelen heeft het bedrijf niet. Op financiële steun vanuit de overheid hoeft men niet te rekenen. De fabriek dient van het ministerie van Industrie geheel financieel onafhankelijk van de overheid te opereren.



5.1.2 Elektriciteitsproblemen

De fabriek heeft net als elders in Irak te kampen met elektriciteitsschaarste. Door de beperkte beschikbaarheid van elektriciteit is men noodgedwongen om het productieproces hierop aan te passen, waarbij delen van de fabriek stil komen te liggen. Er wordt dan in de ene week ruwe grondstoffen verwerkt en opgeslagen, en in de andere week verder verwerkt in de ovens. Een zeer inefficiënte manier van werken, hetgeen ook terug te zien is in de productie. De huidige dagelijkse productiecapaciteit is 800 ton per dag, terwijl de maximale productiecapaciteit 2.000.000 ton per dag is.



5.1.3 Concurrentie

De concurrentie zit vooral in de buurlanden en in Koerdistan, waar men wel beschikking heeft tot 24 uur per dag stroom. Hiermee samenhangend zijn de productieprocessen in die landen ook veel beter ingericht en de output hoger en goedkoper. Daarnaast zijn Iraakse handelaren die in Iran, Saoedi-Arabië of Pakistan slechte kwaliteit cement inkopen, en voor een veel lagere prijs op de Iraakse markt dumpen een groot probleem voor het voortbestaan van de fabriek.

5.1.4 Investeren

De directie van de fabriek heeft enkele pogingen ondernomen om de Al-Muthanna Governorate te overtuigen om in de fabriek te investeren, zonder succes. Momenteel zijn er via het ministerie van Industrie gesprekken gaande met een Egyptische investeerder om de fabriek voor 15 jaar te pachten, waarbij er een minimale productie wordt gegarandeerd. De gesprekken zijn nog gaande, tot op heden zijn er nog geen afspraken vastgelegd.



5.1.5 Bijdrage aan de lokale bevolking

De bevolking is zeer blij met de heropening van de fabriek. Het project heeft enorm bijgedragen aan de economische ontwikkelingen in het gebied. Door de heropening van de cementfabriek zijn er ongeveer 1.600 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, terwijl de fabriek oorspronkelijk ontworpen is voor slechts 350 medewerkers. Dit heeft mede gezorgd voor een flinke daling van het aantal woninginbraken, diefstallen en afpersingen. De daling van de criminaliteit heeft volgens de lokale bevolking gezorgd voor meer stabiliteit en veiligheid in het gebied. Dit wil overigens niet zeggen dat helemaal geen criminaliteit voorkomt in Al-Muthanna.

De heer [REDACTED] heeft in de fabriek met diverse medewerkers gesproken, van geschoold tot ongeschoold. De medewerkers laten duidelijk merken dat er een sterke wil is om de fabriek draaiende te houden, ondanks de vele problemen waarmee de fabriek te kampen heeft.



5.2 Slachthuis Samawa

Eind november 2004 is in opdracht van het SFIR 5 begonnen met de bouw van een slachthuis in Samawa. Het slachthuis is in maart 2005 opgeleverd en voldoet als enige slachthuis in Al-Muthanna aan de Europese hygiëne-eisen. Het slachthuis biedt werk voor maximaal 50 mensen, met een maximale dagelijkse slachtcapaciteit van 200 schapen en 25 à 50 runderen. Het slachthuis heeft drie koelwagens tot zijn beschikking om het vlees gekoeld naar diverse slaggers in de provincie te distribueren.

Contactpersoon:



5.2.1 Huidige status van het project

Het slachthuis bestaat nog steeds en wordt gerund de [redacted] momenteel zijn drie medewerkers werkzaam in het slachthuis. Dagelijks worden er gemiddeld dertig schapen en zeventien runderen geslacht. Men vraagt voor het slachten de volgende tarieven: IQD 1.500 per schaap en IQD 5.000 per rund.

De reden voor het opzetten van een slachthuis was vanwege de onhygiënische omstandigheden in de reeds bestaande slachthuizen in de provincie Al-Muthanna. Het slachthuis is in opdracht van SFIR 5 gebouwd en voldoet aan alle Europese hygiënevoorschriften, mede om onhygiënische slachtomstandigheden te voorkomen. Een groot probleem volgens de heer [redacted] is dat er nog steeds dat levend vee op straat, winkeltjes, restaurants etc. geslacht wordt in plaats van in een slachthuis. De onhygiënische situaties worden in stand gehouden vanwege het feit dat er geen controle is op het illegaal slachten. Indien er iemand toch door een politieagent betrapt wordt op het illegaal slachten, dan worden er geen officiële boetes uitgedeeld. De agent krijgt vaak omgekocht met geld of een stuk vlees. De lokale bevolking voelt zich hierdoor niet genoodzaakt om het vee te laten slachten in een slachthuis.

5.2.2 Beheer

Het beheer van het slachthuis valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Samawa., hetgeen normaliter voor slachthuizen wel het geval zou moeten zijn. In dit specifieke geval heeft de gemeente geweigerd om het beheer tot zich te nemen, omdat het slachthuis niet gebouwd is in opdracht van de gemeente. De veterinaire dienst van Samawa heeft het beheer van het slachthuis op zich genomen, en is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het geslachte vlees.



Er heerst tussen de twee overheidsdiensten veel rivaliteit, de gemeente valt onder het ministerie van Municipalities and Public Works, terwijl de veterinaire dienst onder het ministerie van Landbouw valt. De twee instanties werken ieder op haar eigen manier met een eigen territorium en richtlijnen. Met elkaar samenwerken kennen ze en doen ze niet, dit tot grote frustratie van de lokale ondernemers.



5.2.3 Onderhoud

Het gebouw is in eigendom van de veterinaire dienst en verkeerd in relatief goede staat, met enig zichtbaar achterstallig onderhoud. De adhoc onderhoudswerkzaamheden in en rondom het gebouw worden betaald door de veterinaire dienst en uitgevoerd door een lokale motoragent. De grote onderhoudswerkzaamheden worden niet door de veterinaire dienst betaald, maar dienen de [REDACTED] zelf te betalen. Echter, vanwege de geringe opbrengsten zijn zij niet in staat om deze onderhoudsbeurten te bekostigen. Hierdoor is er achterstallig onderhoud aan het gebouw.

Er zijn geen machines aanwezig, omdat deze niet gebruikt worden tijdens het slachtproces. De koelcellen functioneren, maar worden niet gebruikt. Het vlees wordt na het slachten direct naar lokale markt vervoerd of direct aan de consument verkocht en/of meegegeven. Verder is het gebouw voorzien van noodaggregaten, om elektriciteit te garanderen.

De [REDACTED] hebben te kampen gehad met een te kleine septic tank. De werkelijke oorzaak lag meer aan het feit dat er geen Iraaks bedrijf was dat regelmatig de tank komt legen. Om de septic tank zelf te kunnen legen, hebben de [REDACTED] twee jaar geleden bij de Nederlandse Ambassade in Bagdad om financiële hulp gevraagd bij aankoop van een tanker. De aankoop van de tanker is met financiële hulp vanuit de Nederlandse Ambassade mogelijk gemaakt.



Momenteel ondervindt men problemen met het legen en afvoeren van de container met dierlijk afval. De gemeente heeft geweigerd om de container op regelmatige basis te legen, waardoor men genoodzaakt is om zelf wagens in te huren om deze te legen.



5.2.4 Bijdrage aan de lokale bevolking

Het project heeft kort bijgedragen aan de werkgelegenheid. De aanbesteding voor de bouw van het slachthuis is bewust naar Iraakse aannemersbedrijven gegaan. Hierdoor is de werkgelegenheid voor de duur van de bouw (drie maanden) van het slachthuis toegenomen.

De lokale bevolking heeft zeer positief gereageerd op de komst van het slachthuis. De komst van het slachthuis had ervoor moeten zorgen dat de slachtomstandigheden hygiënischer werden, hetgeen ook gelukt is. Echter, de bedoeling was ook om de lokale bevolking te ontmoedigen om zelf het vee op straat of thuis te slachten. Helaas constateren de [REDACTED] dat er nog steeds illegaal op straat vee geslacht wordt.



6. Elektriciteitsvoorziening

In dit hoofdstuk worden drie recovery substations in Hilal, Najmi en Majed besproken, alsmede de bijbehorende vijf operator gebouwen. Voor de evaluatie van deze projecten heeft de heer [REDACTED] gesproken met diverse personen die in de substations werkzaam zijn sinds de renovatie van de diverse substations.

6.1 Substation Hilal

Substation Hilal is in opdracht van SFIR gerenoveerd, de renovatiewerkzaamheden waren zeer divers. Het substation verkeerde voor de renovatie in een vervallen staat. Het dak van het station lekte, waardoor er water op het apparaat terecht kon komen. Hetgeen tot gevaarlijke situaties leidde, zoals kortsluiting, brand en/ of uitval van elektriciteit. Tijdens de renovatiewerkzaamheden zijn de toiletten en het dak van het station vervangen. Daarnaast is er nieuwe apparatuur geplaatst, zoals twee airconditioners, transformatoren, voedingen, accu's en overige professionele apparaten voor het substation.

Contactpersoon:



6.1.1 Huidige status van het project

Het substation verkeert in goed staat en zorgt momenteel voor de transformatie en distributie van elektriciteit van het substation naar de dorpen in Hilal en omstreken. De renovatiewerkzaamheden zijn destijds met grote zorg, juiste kennis en expertise en toezicht verzorgd.

6.1.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

Het project heeft een grote bijdrage geleverd aan de lokale bevolking. Mede dankzij de hulp van SFIR is het substation nog in gebruik, en kan het substation de dorpen in Hilal e.o. blijven voorzien van stroom. Het vervangen van oude apparatuur met nieuwe apparatuur heeft zorggedragen aan een 90% stijging van de elektriciteitsdistributie in het gebied.

In het substation zijn zes operators werkzaam, voor de renovatie waren dit er twee. De operators zijn zeer te spreken over de door SFIR geleverde diensten en management.



6.2 Substation Najmi

Het substation in Najmi is in opdracht van SFIR grondig gerenoveerd. Tijdens de renovatiewerkzaamheden zijn de elektriciteitsbedradingen in het gebouw vervangen, muren zijn gerepareerd en geveerd en toiletten zijn betegeld. Ook in dit substation is nieuwe apparatuur geplaatst, zoals airconditioners, transformatoren, voedingen en accu's. Daarnaast is in het substation een extra kamer gebouwd voor het beveiligingspersoneel.

Contactpersoon:



6.2.1 Huidige status van het project

Het substation voorziet momenteel Najmi en omstreken van elektriciteit. Door de renovatie is de levering van stroom aan de lokale bevolking een stuk stabiel en betrouwbaarder geworden. Verder verkeert het substation in goed staat, met enig zichtbaar achterstallig onderhoud.

6.2.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

Het project heeft een grote bijdrage geleverd aan de lokale bevolking. Door het project is de distributie van stroomvoorziening naar Najmi e.o. betrouwbaarder geworden en hebben vier operators een baan.

6.3 Substation Majed

In opdracht van SFIR is een nieuw substation gebouwd in Majed. In het verleden stond een deel van de installatie buiten op een stuk terrein.

Contactpersoon:




6.3.1 Huidige status van het project

Het substation verkeert in zeer goede staat en zorgt voor een stabiele distributie van elektriciteit aan de inwoners van Majed e.o. Het gebouw zelf en de ruimtes in het gebouw zien er keurig verzorgd uit. De operators die werkzaam zijn in het substation zijn heel trots op 'hun' substation. Tijdens het bezoek gaven de operator aan zeer tevreden te zijn met de door Nederland geleverde apparatuur en materialen. Daarnaast waren de operators onder de indruk van de gedetailleerde afwerking van bijvoorbeeld de kabels, de kabels waren weggewerkt in kabelgoten.

Het is opmerkelijk dat het substation met grote zorg door de operators is onderhouden. Van de geëvalueerde projecten is dit project dat het meeste indruk heeft gemaakt op de heer [REDACTED]

6.3.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

De bouw van dit station is zeer nuttig gebleken. Het project heeft ervoor gezorgd dat elektriciteit beschikbaar is voor de inwoners van Majed e.o., die voorheen geen toegang hadden tot het elektriciteitsnetwerk. In het substation zijn zes operators werkzaam.

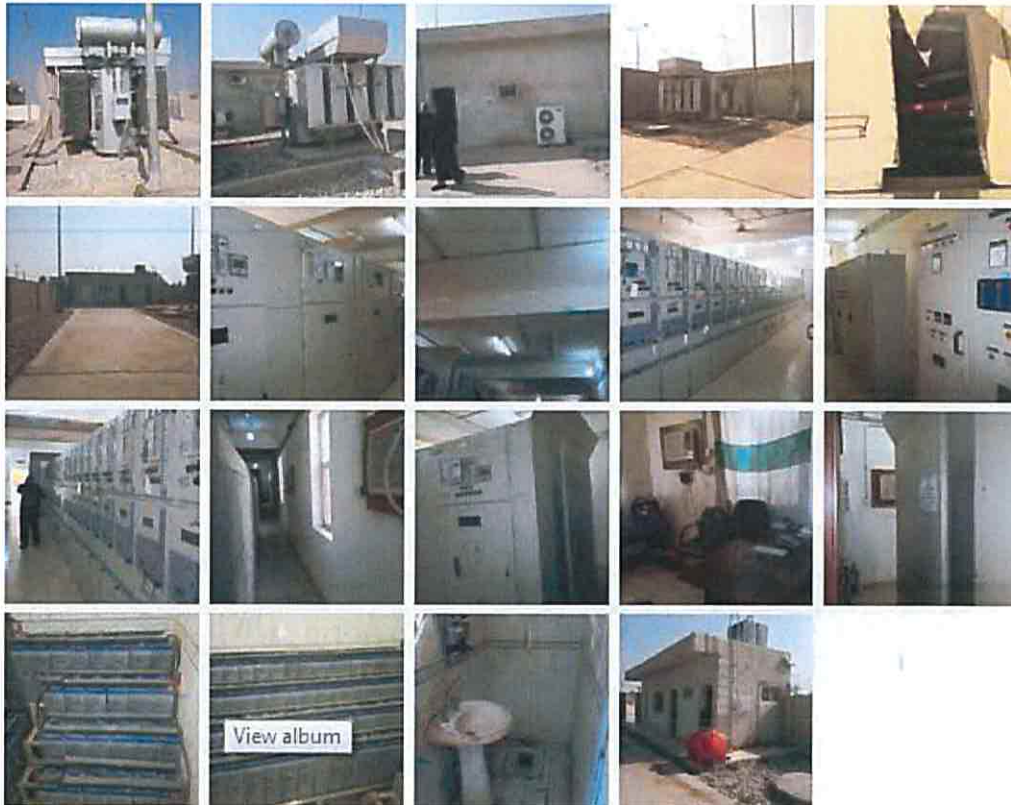

7. Diversen

In dit hoofdstuk worden een viertal politiebureaus, drie jongeren- en sportcentra en een brandweerkazerne geëvalueerd. Beeldmateriaal van de politiebureaus zijn er niet, het ministerie van Binnenlandse Zaken moet hiervoor toestemming verlenen. Gezien de looptijd van de aanvraagprocedure en de minimale kans op toestemming is er geen aanvraag ingediend.

7.1 Politiebureau Indarradji

Het is onduidelijk of het betreffende politiebureau met hulp van SFIR is gerenoveerd. De geïnterviewde politieagenten konden dit niet met zekerheid bevestigen. Het politiebureau was voor de renovatie, in de tijd van Saddam Hussein, in zeer slecht staat. De overheid had geen geld om de politiebureaus te onderhouden. Het bureau is met buitenlandse hulp gerenoveerd en verkeerd in goed staat.

De Iraakse politieagenten hebben van SFIR instructeurs politietrainingen gekregen op het gebied van arrestatietechnieken en vuurwapens. Daarnaast is het politiebureau voorzien van vuurwapens inclusief een geringe hoeveelheid munitie. De agenten hebben aangegeven de hulp vanuit Nederland te waarderen.

Contactpersoon:

[REDACTED]

Het project heeft vooral bijgedragen aan de veiligheidssituatie in het gebied. Het gebied is volgens de inwoners van Indarradji een stuk stabiel geworden, mede door de zichtbaar aanwezige politieagenten. Verder is de lokale bevolking onder de indruk van de snelheid waarin het politiebureau volledig operationeel is geworden.

7.2 Brandweerkazerne Al-Khidir

SFIR heeft in 2003-2005 de brandweerkazerne van Al-Khidir, dat uit de jaren zestig stamt, gerenoveerd. Naast de renovatie van het gebouw heeft SFIR trainingen gegeven aan de brandweerlieden van Al Khidir. Het betroffen trainingen op het gebied van brandbestrijding en in het verlenen van eerste hulp.

Contactpersoon:



7.2.1 Huidige status van het project



Het pand verkeert in redelijke staat, er is veel achterstallig onderhoud. Er worden weinig tot geen herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en aan het pand. Vaak onderneemt men pas maatregelen op het moment dat het te laat is. Alleen schade waarbij de werkzaamheden van de brandweer kunnen belemmeren worden hersteld. Het geld om de schade te herstellen komt van het ministerie van Defensie, hiervoor moet men eerst een aanvraag indienen.

Het wagenpark van de brandweer bestaat uit een pompwagen en een watertanker. Het onderhoud aan de wagens wordt door de brandweerlieden zelf gedaan. Alle financiële middelen die de brandweer nodig heeft om bijvoorbeeld onderdelen of materialen te vervangen dienen bij het ministerie van Defensie aangevraagd te worden. Momenteel zijn er 22 brandweerlieden werkzaam op de kazerne, met een dagelijkse bezetting van zes man.



7.2.2 Bijdrage aan de lokale bevolking


Het project heeft vooral bijgedragen aan een tijdelijke werkgelegenheid. De renovatie van de brandweerkazerne is uitgevoerd door lokale aannemersbedrijven. Na de renovatie zijn er geen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.

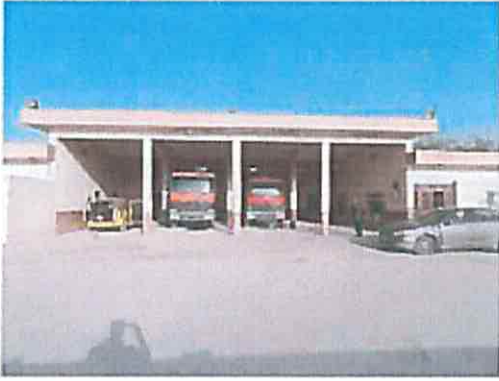

7.3 Restauratie gebouw vrouwenbeweging

Het gebouw van de vrouwenbeweging in Samawa is door SFIR gerestaureerd en gerenoveerd.

Contactpersonen:



7.3.1 Huidige status van het project

Het gebouw van de vrouwenbeweging verkeerd in zeer goede staat. Het is opmerkelijk dat niet de vrouwen van de vrouwenbeweging degene zijn die gebruik maken van het gebouw. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door een Iraakse overheidsorganisatie dat gebouwen, percelen en kavels beheerd.

Uit gesprekken met de [redacted] blijkt dat de activiteiten van de vrouwenbeweging in 2009 zijn beëindigd. De provincie Council van Al-Muthanna heeft destijds met SFIR geld geïnvesteerd, om diverse activiteiten te organiseren voor de vrouwenbeweging. Echter, geen van de activiteiten zijn uitgevoerd. Er bestaan grote twijfels over de rol van [redacted]. Het is onduidelijk wat er met het geld, dat bestemd was om activiteiten voor de vrouwenbeweging te organiseren, is gebeurd. Wij hebben bij de provincie Council al-Muthanna een achtergrond check uitgevoerd naar [redacted]. Uit diverse gesprekken blijkt dat [redacted] van corruptie is beschuldigd, naar verluid is [redacted] een jaar geleden naar het buitenland gevlucht.

Helaas heeft het incident ertoe geleid dat er de provincie al-Muthanna geen opvolger kan vinden om dergelijke projecten voort te zetten, zoals een vrouwenbeweging.





7.4 Politiebureau Najmi

Het betreft een oud en verwaarloosd politiebureau, dat in opdracht van SFIR weer is opgeknapt. Daarnaast hebben SFIR instructeurs politietrainingen verzorgd aan Iraakse agenten.

Contactpersoon:

[REDACTED]

Het gebouw verkeert in een zeer slechte conditie, sinds de door SFIR uitgevoerde renovatiewerkzaamheden is er geen onderhoud meer gepleegd. Scheuren en barsten in de muren zijn duidelijk waarneembaar, het verf bladdert van de muren en er is sprake van verzakking.

Het project heeft vooral bijgedragen aan de veiligheidssituatie in het gebied. Er is meer politie op straat, waarbij het veiligheidsgevoel bij de bevolking groter is geworden. De lokale overheden schenken veelal te weinig aandacht aan de ontwikkelingen in de dorpen op het platteland. SFIR heeft duidelijk aandacht geschonken aan de ontwikkelingen buiten de groten steden. De politieagenten zijn derhalve erg dankbaar met de geboden Nederlandse hulp en de manier waarop SFIR het project heeft aangepakt.

7.5 Politiebureau Busaya

Busaya is een klein dorpje middenin de woestijn. Het plaatselijke politiebureau is in de jaren '30 door de Engelsen gebouwd. Ook dit politiebureau verkeerde in een vervallen staat, het bureau is door SFIR opgeknapt. Momenteel wordt het gebouw niet meer als politiebureau gebruikt en is het wordt het door het Iraakse leger gebruikt. Het is onduidelijk of de agenten uit Busaya SFIR politietrainingen hebben gevolgd.

In 2011 is in Busaya, door de Iraakse autoriteiten, een nieuw politiebureau gebouwd. Busaya ligt in een relatief geïsoleerd gebied, met slechte toegangswegen naar het dorpje. De lokale bevolking is tevreden met alle hulp dat geboden is. Het project heeft vooral bijgedragen aan de veiligheidssituatie in het gebied, door de aanwezigheid van politieagenten is het gebied veiliger geworden.

Contactpersoon:

[REDACTED]

7.6 Politiebureau Hilal

Hilal is een klein dorpje waar veel boeren wonen, die samen een hechte gemeenschap vormen. Het politiebureau is in 1936 gebouwd en is destijds door SFIR gerenoveerd. Echter, van dit project is geen informatie beschikbaar. Het gebouw heeft tegenwoordig een monumentenstatus gekregen en fungeert niet meer als politiebureau. De lokale autoriteiten hebben een nieuw politiebureau laten bouwen. Agenten die werkzaam waren op het oude bureau zijn niet meer te traceren.

Contactpersoon:

[REDACTED]

7.7 Jongeren- en sportcentrum voor vrouwen

Volgens de heer ██████ zat in het verleden een mevrouw in de provincie council die opkwam voor jeugd- en sportzaken voor vrouwen. Sinds het vertrek van deze mevrouw enkele jaren geleden is er geen opvolger die de belangen heeft overgenomen. Het is onduidelijk of het om ██████ gaat.


De in het verleden opgezette projecten voor vrouwen zijn verwaarloosd en uiteindelijk beëindigd. Sindsdien zijn er ook geen nieuwe projecten op het gebied van vrouw opgezet.

Contactpersonen:

██████ ██████
██████ ██████
██████ ██████

7.7.1 Huidige status van het project

Het project bestaat niet meer, de locatie is teruggegeven aan het directoraat voor Jeugd en Sport.

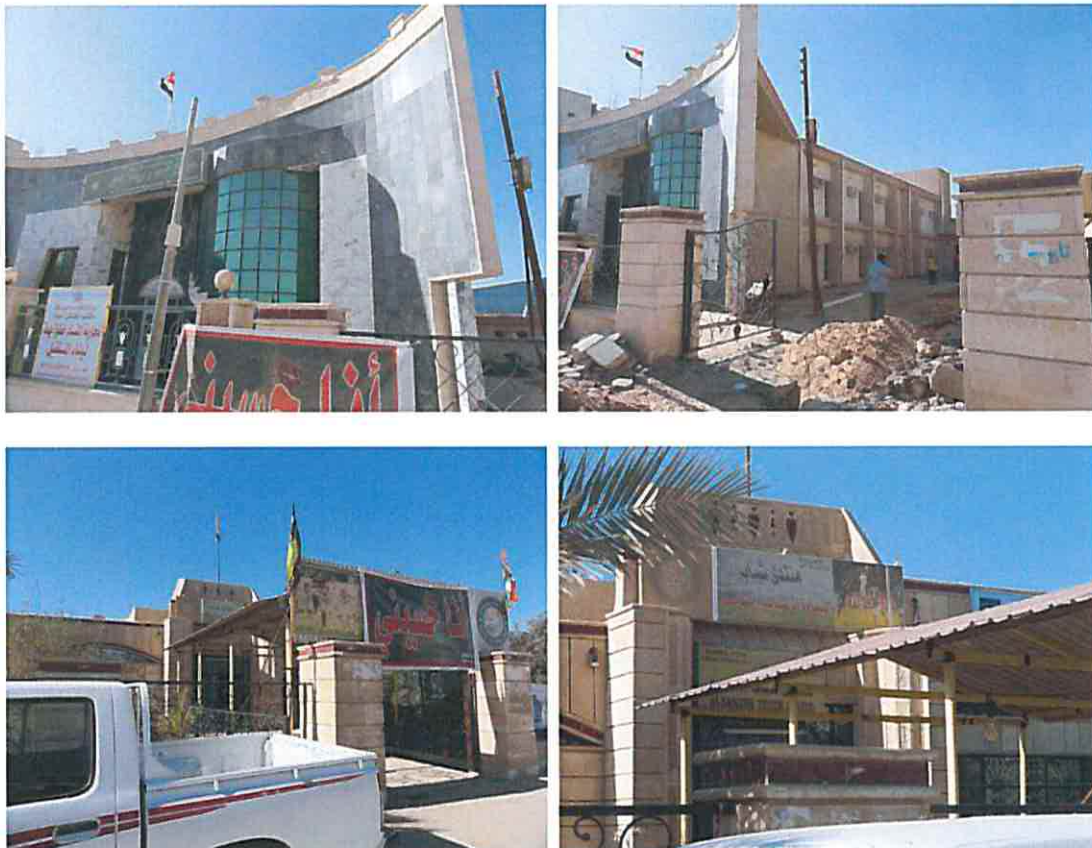



7.8 Jongerencentrum Warka

Het jongerencentrum is in 2004 door SFIR gerenoveerd. Naast de renovatiewerkzaamheden aan het gebouw is ook het speelveld opgeknapt en is er een tribune gebouwd voor toeschouwers. De werkzaamheden die destijds zijn uitgevoerd waren niet geheel naar tevredenheid, de kwaliteit van de renovatie was matig tot slecht.

Contactpersoon:



7.8.1 Huidige status van het project



Het jongerencentrum wordt goed onderhouden en is volop in gebruik. De jongeren zijn erg blij met de renovatie van het jongerencentrum. Het heeft ervoor gezorgd dat de jongeren weer een plek hebben om elkaar op te zoeken en om te sporten. Het gebouw is recentelijk nog een keer gerenoveerd door het ministerie van Jeugd en Sport.



7.8.2 Bijdrage aan de lokale bevolking

Het project heeft vooral bijgedragen op sociaal maatschappelijk gebied. De jongeren maken graag gebruik van de faciliteiten van het jongerencentrum, waarbij veel sociale contacten worden gemaakt en gesport wordt.



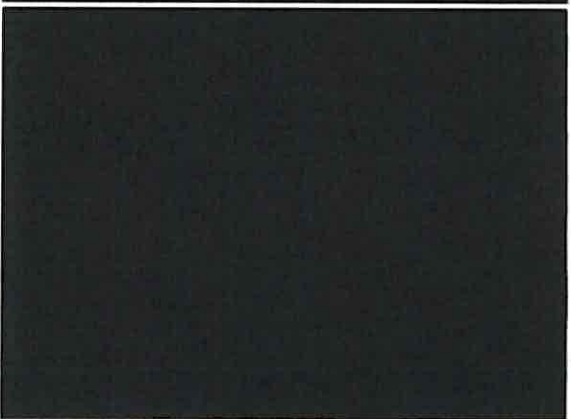

7.9 Sportclub al-Warka

Het is onduidelijk of het oude gebouw destijds in opdracht van SFIR gerenoveerd of gebouwd is. Het oude sportclubgebouw is in opdracht van de lokale autoriteiten gesloopt en herbouwd. Het gebouw is wordt momenteel niet als sportclub gebruikt, maar doet dienst als vergaderruimte voor de dorpsraad. De vergaderingen vinden hier eens in de twee maanden plaats. Het directoraat van Jeugd en Sport heeft echter aangegeven dat men nog niet weet wat de exacte functie van het nieuwe gebouw zal zijn. Verder is er geen informatie beschikbaar.

Contactpersoon:

